


# Protocollo Controllo di prova



M.P.M. Ambiente srl					
Viale Lombardia, 45 - 20874 Busnago - Tel: 039-6823736 - Fax: 039-6823607					
Numero corrente	65	Numero dell'ordine	0		
Dittalufficio		Data dell'ordine	23/04/2015		
Via		Metodo:	LD		
CAP / Località		Località dell'ordine	TREVIOLLO		
Interlocutore	GEOM				
Oggetto					
Commento	cantiere in fase d'opera				
Condotta	NERA	Temperatura (°C)	22		
Inizio pozzetto	P4	Pressione dell'aria (mbar)	200		
Fine pozzetto	P5	Anno di fabbricazione	2015		
Lunghezza della condotta (m)	47	Materiale	GRES		
Larghezza nominale (DN)	400	Tipo di canale	NERA		
Falda acquifera (m)	No	Altro	NUOVA PULITA		
Dati di prova conformi alla Norma: EN 1610 / LD umido					
Pressione di prova (mbar)	200				
Tempo di stabilizzazione(h)	00:05:00	Tempo (minuti)	00:02:30	Calo di pressione (mbar)	15
Dati di prova dopo la misurazione					
Pressione di prova (mbar)	225,6				
Tempo di stabilizzazione(h)	00:05:04	Tempo (minuti)	00:02:33	Calo di pressione (mbar)	1,3
Analisi					

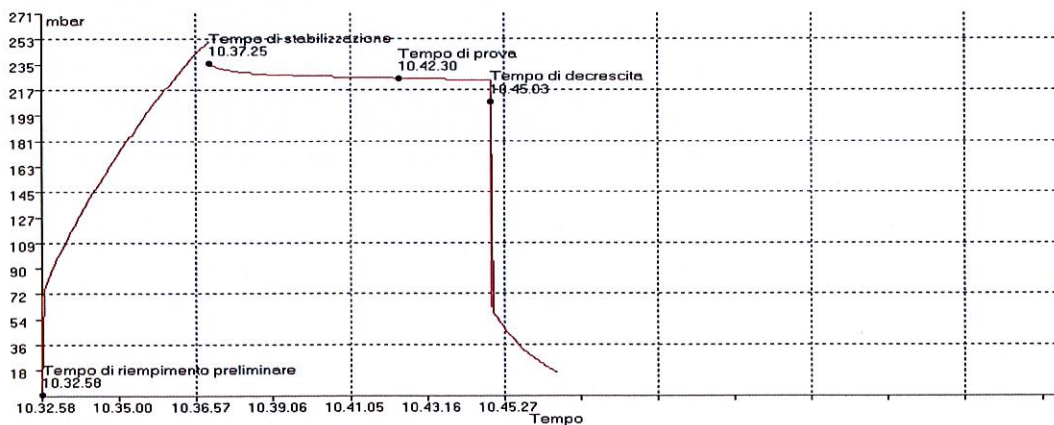

Inizio misurazione pressione: 225,6 mbar	Fine misurazione pressione: 224,3 mbar
Calo di pressione: 1,3 mbar	Misuratore: GMH 3110/3160
L'oggetto di prova conforme alla Norma EN 1610 / LD umido Si dichiara l'oggetto a tenuta.	
Collaudatore: _____ ( P M ) verificata in 23/04/2015	
